


大坪コミュニティセンター・大坪保育園複合施設建設の概要

1 位 置	伊万里市大坪町甲2863番地1		
2 敷地面積	6,983.61㎡		
3 構 造	鉄骨造平屋建		
4. 延床面積	1517.05㎡	うち、コミュニティセンター	754.07㎡ 保育園 762.98㎡
5. 事業費	総事業費 (事業費内訳)	532,811,000円	
	本体建築工事	367,950,000円	
	機械設備工事	72,490,000円	
	電気設備工事	39,380,000円	
	設計委託(基本・実施)	23,042,000円	
	地質調査業務委託	2,107,000円	
	設計監理委託(工事・解体)	11,770,000円	
	初度備品	15,600,000円	
	その他(手数料等)	472,000円	
	(財源)	公共施設等適正管理推進事業債	
6. 施 工 設計・監理	金崎・川原建設共同企業体 株式会社九電工伊万里営業所 MEI設計有限会社		
7. 建設経過	平成30年度		
	平成30年8月6日	基本設計着手	MEI設計有限会社
	平成31年3月6日	基本設計完了	
	令和元年度		
	令和元年10月21日	実施設計着手	MEI設計有限会社
	令和元年10月21日	地質調査着手	株式会社扶桑エンジニアリング
	令和2年1月15日	地質調査完了	
	令和2年3月23日	実施設計完了	
	令和2年度		
	令和2年12月21日	建築工事契約締結	金崎・川原建設共同企業体
	令和2年12月21日	機械設備、電気設備工事契約締結	株式会社九電工伊万里営業所
	令和3年1月15日	起工式	
	令和3年度		
	令和3年11月4日	複合施設(建物)完成	
	令和3年11月8日	新大坪コミュニティセンター運用開始	
	令和3年11月23日	落成式	
	令和3年12月13日	新大坪保育園運用開始	
	令和4年1月28日	複合施設電気設備・機械設備工事完了(予定)	
	令和4年3月18日	複合施設建築工事完了(予定)	

施設概要

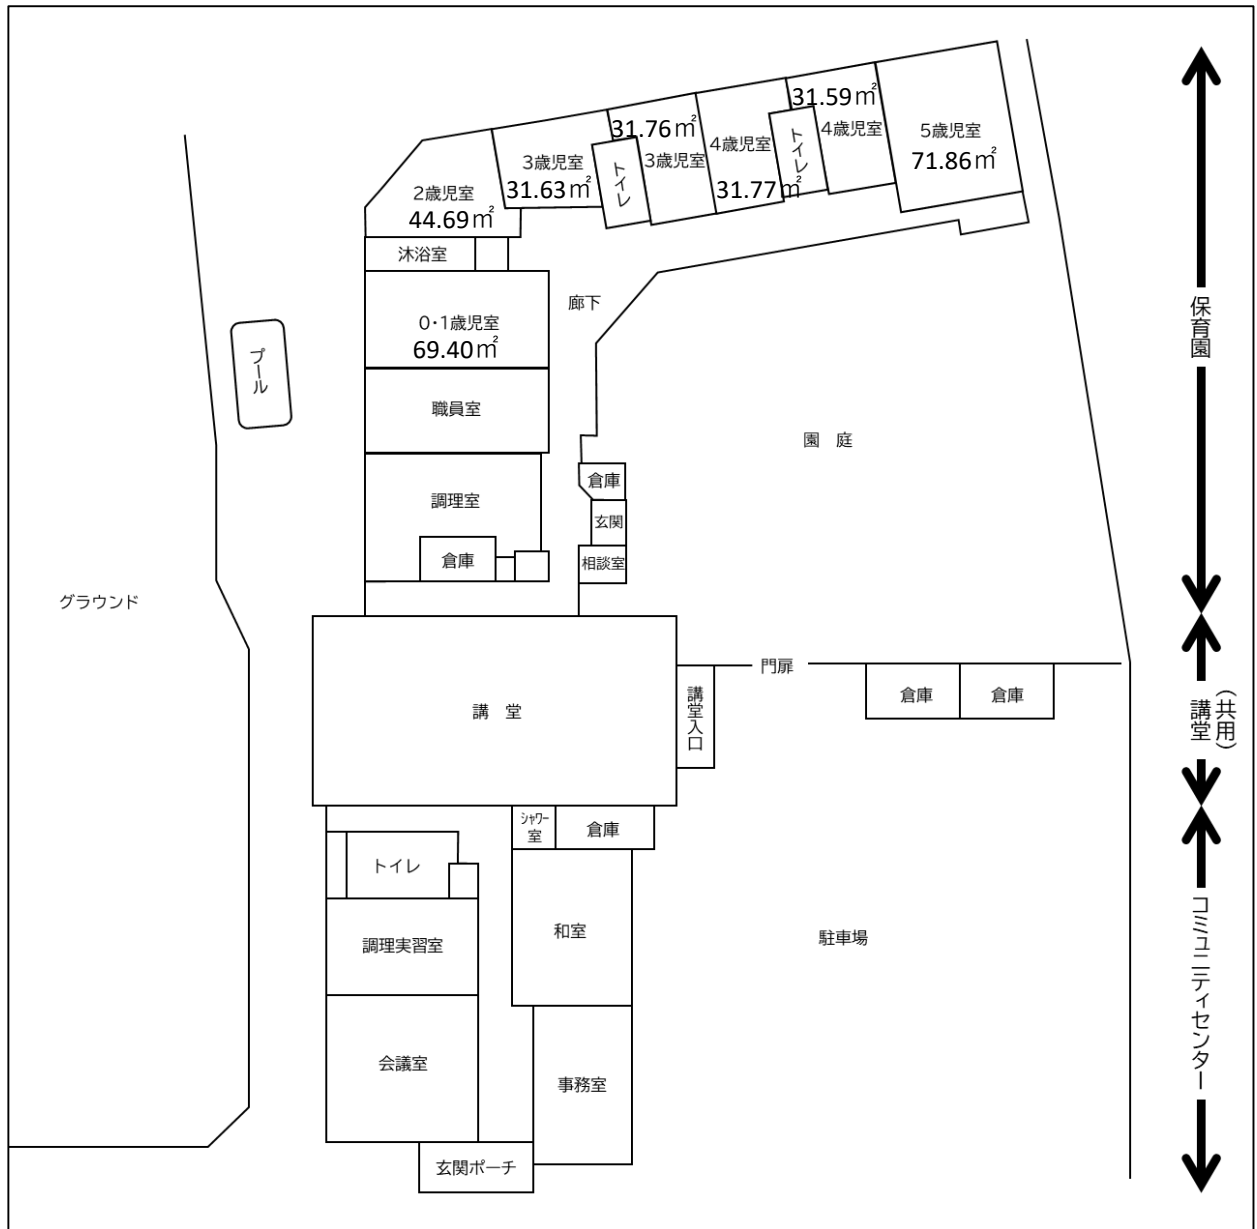

コミュニティセンター入口

南側立面図



コミュニティセンター

講堂入口

保育園入口

東側立面図
